

Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava/ Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: <https://www.osu.cz>

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú.: 931761/0710

Vyřizuje/zastupuje: Mgr. Bc. Jan Humpolík (právník; rektorát, referát právní služby) / [jan.humpolik@osu.cz](mailto:jan.humpolik@osu.cz)  
č. j.: OU-75621/90-2021, Datum: 31. 8. 2021

**FOCUS-Centrum pro sociální a  
marketingovou analýzu, spol. s r.o.**  
Vrchlického sad 1894/4, Černá Pole,  
602 00 Brno

IČ: 49967185

ID datové schránky: dxs6snb

ke smlouvě ze dne 7. 3. 2019 (SML 4501/0004/19)

## Odstoupení od části smlouvy

Ostravská univerzita (dál jen „OU“) jako Objednatel a Zadavatel ze smlouvy uzavřené dne 7. 3. 2019 (která je evidována ve vnitřním elektronickém informačním systému OU jakožto SML 4501/0004/19) **odstupuje od této smlouvy (ve znění všech jejích dodatků) v rozsahu rekrutace probandů.**

OU tímto svým odstoupením využívá svého práva založeného ujednáním čl. IV odst. 10 smlouvy.

OU dále **oznamuje, že má stále zájem na plnění dané smlouvy (ve znění všech jejích dodatků) v rozsahu údržby panelu probandů (dlouhodobé monitorování po dobu 12 měsíců) nejméně do dne 31. 8. 2022.** OU též očekává řádné a včasné plnění smlouvy ve vymezeném rozsahu, neboť k takovému jednání se zavázala společnost FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o. jakožto Zhotovitel i Dodavatel smlouvou ve znění všech jejích dodatků.

V Ostravě dne 31. 8. 2021

.....  
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.,  
rektor Ostravské univerzity

## Zdůvodnění předkládaného návrhu částečného odstoupení

Reg. č. projektu: 0010185  
Druh kontroly: interim  
Pořadové číslo zakázky: 0025  
Název zakázky: Služby zajištění kohorty a správy dat pro výzkumný program č.4 projektu HAIE II  
Ev. číslo zakázky ve VVZ: Z2018-040346

### Navržená změna smlouvy

Předmětem částečného odstoupení od smlouvy je **podstatné porušení smlouvy z důvodu prodlení dodavatele** (Článek IV., odst. 10 Smlouvy – *Cena a platební podmínky*) oproti termínům sběru dat sjednaným dle této smlouvy.

Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele rekrutaci 1500 probandů, tj. účastníků výzkumu HAIE. Rekrutace znamená kompletní organizace oslovení, nábory, provedení vstupních testů (screening) a výběru probandů, zajištění administrativních úkonů spojených se zapojením probandů do vstupního testování na OU (**aktivity sběru dat**) a jejich dlouhodobého monitorování (12 měsíců), včetně aktivit spojených s udržením kohorty (**aktivity údržby panelu**) a právního ošetření zapojení jednotlivců do výše uvedeného výzkumu.

### Termíny plnění smlouvy

Článek III., odst. 2 – *Doba, způsob a místo plnění* Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2021 stanovuje termíny plnění takto:

- termín sběru dat k 31. 8. 2021 (částečné odstoupení od Smlouvy)
- termín pro ukončení poskytovaných služeb/„údržba“ panelu probandů k 31. 8. 2022 (pokračování plnění Smlouvy).

Dodavatel se dostal do prodlení s plněním závazku sběru dat a do stanoveného termínu požadované množství probandů nedodá. Naplnění termínu sběru dat spočívá v tom, že proband dorazí na místo vstupního testování a absolvuje měření v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu.

Nenaplnění závazku Dodavatele provést pro Zadavatele rekrutaci 1500 probandů nemá vliv na závazek Dodavatele zajistit dlouhodobé monitorování probandů po provedeném vstupním testování. Roční sledování firmou FOCUS není důvod odvolávat, protože:

- Dodavatel disponuje systémem adaptovaným pro řízení panelu výzkumného programu č. 4 projektu HAIE, systém se osvědčil a spolupráce mezi Dodavatelem, Zadavatelem a probandy funguje
- Dodavatel má nastaven systém motivace probandů k aktivní účasti na projektu, firma vyplácí odměny a organizuje loterii.

Data z ročního sledování probandů jsou součástí výzkumných aktivit projektu, změna Dodavatele by znamenala vysoké riziko změny výzkumných podmínek v průběhu běžícího výzkumu a znehodnocení dat. Z tohoto důvodu realizujeme jen **částečné odstoupení od smlouvy**.

### **Důvod částečného odstoupení od smlouvy**

V důsledku epidemie covid-19 došlo k časovému prodloužení Dodavatele oproti termínu sběru dat stanovenému ve smlouvě. V návaznosti na tyto okolnosti došlo k prodloužení termínu pro sběr dat z původního termínu 28. 2. 2021, a to Dodatkem č. 2 ze dne 9. 7. 2020 a Dodatkem č. 3 ze dne 30. 3. 2021 celkem o 6 měsíců (do 31. 8. 2021).

Prodloužení bylo pro projekt ekonomicky i vědecky přínosné. Při prodlužování smlouvy jsme sledovali cíl se v rámci ztížených covidových podmínek co nejvíce přiblížit finálnímu stavu statisticky významně velkých kohort rekrutovaných dle jednotlivých nezávisle proměnných výzkumu bez navyšování financí dodavatelské firmě. Velikost kohorty stanovili kvalifikovaným odhadem experti ve Studii proveditelnosti, jež je Přílohou č. 2 – *Žádost o podporu včetně všech příloh schválená Poskytovatelem dotace ke dni vydání tohoto Rozhodnutí zpřístupněná Příjemci v IS KP14+ a Poskytovateli dotace v MS2014+ Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16\_019/0000798-01 ze dne 27. 4. 2018*. Prodloužení nábory a následného měření umožnilo schválení Podstatné žádosti o změnu Řídicím orgánem zahrnující přesun 50 % plnění indikátorů do období udržitelnosti projektu:

- indikátor **20211** Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty.
- Indikátor **20216** Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty
- Indikátor **20214** Podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků

Tato změna měla dopad na právní akt, Řídicí orgán vydal Rozhodnutí o změně č. 3 - *Rozhodnutí č. 16\_019/0000798-04 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 16\_019/0000798-01 ze dne 4. 3. 2021*.


Tímto Rozhodnutím získal Zadavatel možnost déle pracovat na sběru dat a „vytvářet“ indikátory později ve fázi udržitelnosti projektu.

Údaje z níže uvedené tabulky dále deklarují, že bylo stále reálné provést 1500 vstupních testování nabraných probandů vzhledem k počtu dnů měření a bylo v zájmu Zadavatele souhlasit s prodloužením termínu sběru dat. Dle přílohy č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy – *Specifikace předmětu plnění* byla celková testovací kapacita (tj. testování subjektů od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2021) predikována na 1695 probandů při vytížení laboratoří 3 probandy za 5 dní v týdnu a na 2025 při vytížení laboratoří 3 probandy po dobu 6 dnů v týdnu.

	Celkově za 2020	213	257	644	772	639	771
Kvartál	2021						
Q1	Leden	20	24	0	0	60	72
	Únor	20	24	0	0	60	72
	Březen	23	27	0	0	69	81
Q2	Duben	20	23	0	0	60	69
	Květen	21	25	0	0	63	75
	Červen	20	25	0	0	60	75
Q3	Červenec	22	25	0	0	66	75
	Srpen	22	27	0	0	66	81
	Celkově za 2021	168	200	0	0	504	600
	Celková testovací kapacita (tj. testování subjektů od 1.4. 2019 do 31.8. 2021)	565	675	1380	1644	1695	2025
<b>Pozn:</b> od 5.10.2020 se z důvodu snižování rizika neobsazuje dvoulůžková spánková laboratoř dvěma osobami.							

Z předchozích zkušeností Zadavatele dále vyplývá, že nejvíce vstupních testování probandů probíhalo v měsíce červen – srpen v letech 2019 i 2020, což byl také důvod pro maximální prodloužení plnění smlouvy Dodavateli (viz graf níže).

Vývoj vytíženosti testovací kapacity  
1.4. 2019-17.2.2021

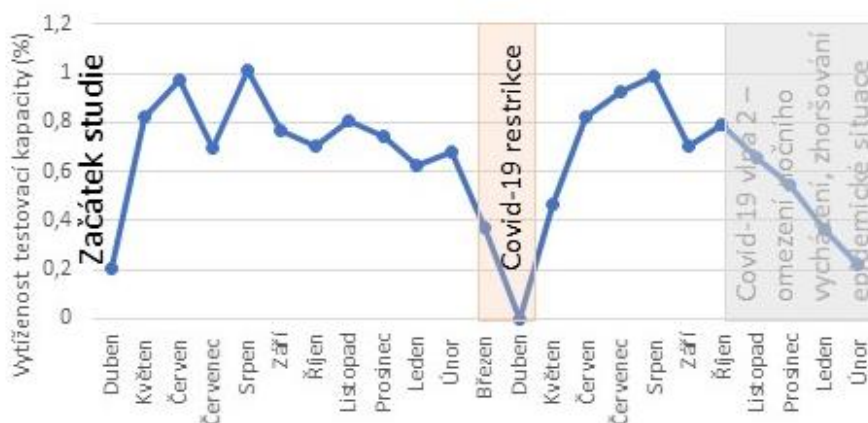

### Vliv na naplnění cílů a výstupů projektu

Zadavateli nejsou k užitku žádná data získaná od jakéhokoliv probanda po 31. 8. 2021. Je to způsobeno tím, že Zadavatel tato data nemůže vyhodnotit a zpracovat, protože:

- pracovní smlouvy personálu v laboratořích, tj. zaměstnanců OU hrazených z projektu, budou ukončeny k termínu 31. 8. 2021, projekt nedovoluje proplatit odměny za práci oněch laborantů po 31. 8. 2021 z důvodu vyčerpaného rozpočtu v kapitole Osobní výdaje;
- navazující služba odběru krve je taktéž smlouvou ošetřena do 31. 8. 2021, bez dat z odběrů krve není vstupní testování kompletní a z vědeckého hlediska je takový výstup nepoužitelný;
- časový harmonogram projektu je pevně dán, termín ukončení realizace projektu je 30. 11. 2022. Aby bylo dosaženo vědeckých cílů projektu, je nezbytné ukončit fázi měření probandů k 31. 8. 2021, poté následuje fáze ročního monitorování probandů do 31. 8. 2022 a následně pokračuje zpracovávání a publikování dat ve vědeckých člancích.

Ačkoli se dodavateli nepodařilo zajistit kohortu 1500 probandů, díky prodloužení Smlouvy provedl Zadavatel 205 dalších vstupních testování a podařilo se docílit celkové hodnoty 1314 probandů. Velikost kohorty i v nižším počtu stále naplňuje kvalitu nastavených vědeckých cílů, aktivit a výsledků. Z výzkumného hlediska založením kohorty o velikosti 1314 probandů získal Zadavatel většinu sub kohort, které měla dodavatelská firma dodat. Věkové kategorie, region, status pohybové aktivity a pohlaví společně v kombinacích vytvářejí sub kohorty, které lze výzkumně zkoumat a vzájemně porovnávat. Prodloužení výzkumu umožnilo získat zejména pohybově neaktivní populaci, která se v období epidemie covid-19 získávala velice obtížně. Nyní je možné z výzkumného hlediska odpovídat na výzkumné hypotézy a otázky, které si Zadavatel stanovil ve Studii proveditelnosti.

### **Soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

Ostravská univerzita jakožto zadavatel využívá svého oprávnění založeného ustanovením § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a odstupuje od závazku ze Smlouvy spočívajícího v rekrutaci probandů (aktivity sběru dat). Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že pokračování v plnění tohoto závazku ze Smlouvy by nevyhnutelně vedlo k porušování pravidel (norem) obsažených v ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Prodloužení doby pro splnění závazku spočívajícího v rekrutaci probandů (aktivity sběru dat) na dobu po 31. 8. 2021 by totiž nebylo ani nezbytné (§ 222 odst. 5); měnilo by ekonomickou rovnováhu výrazně ve prospěch Dodavatele, který by poskytoval danou službu a nechával si za ní platit, aniž by Zadavatel mohl takovou službu smysluplně využít (§ 222 odst. 3 písm. b)); nebylo by ani způsobeno nepředvídanými okolnostmi (§ 222 odst. 6) a konečně by taková změna přesáhla hodnotu změny de minimis (§ 222 odst. 4 písm. b) bod 1). Poněvadž by tedy toto eventuální prodloužení nemohlo naplnit ani jeden z dovolených důvodů pro podstatnou změnu závazku po 31. 8. 2021, využil Zadavatel svého práva odstoupit od konkrétního závazku ze Smlouvy. Zadavatel však byl povinen odstoupit pouze od závazku spočívajícího v rekrutaci probandů (aktivity sběru dat), jelikož další závazek ze smlouvy (čili závazek spočívající v aktivitách pro údržbu panelu probandů) zůstává nadále splnitelný jak pro Zadavatele, tak pro Dodavatele, a tak jeho zánik není slučitelný s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel mohl uplatnit své právo založené ustanovením § 223 odst. 1 pouze v rozsahu nezbytně nutném, a proto odstoupil od závazku spočívajícího v rekrutaci probandů (aktivity sběru dat), nikoliv však od závazku spočívajícího v aktivitách pro údržbu panelu probandů. Jen tento postup Zadavatele zachovává zásadu přiměřenosti stanovenou ustanovením § 6 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.
